

BOLETÍN DE OBRAS JULIO 2020

➔ CANELONES SE ILUMINA

Más de 1700 focos de alumbrado nuevos

En la primera mitad de 2020 se encendieron un total de 1.725 luminarias, de las 3.090 previstas para encender este año.

El total comprometido para el período julio 2015-diciembre 2020 es de 20.000. Sin embargo, a mediados de 2020 ya se ha superado ese número con un total de 20.307 luminarias encendidas.





➔ RECOMENDACIONES COVID-19



En el siguiente [link](#) podrán consultar toda la información, medidas de prevención y recomendaciones del Gobierno de Canelones vinculadas al COVID-19:

<http://www.imcanelones.gub.uy/es/content/covid-19>

INICIA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. RÍO NEGRO EN EL PINAR

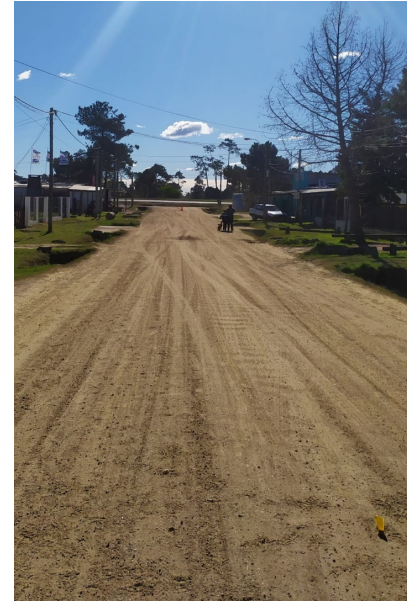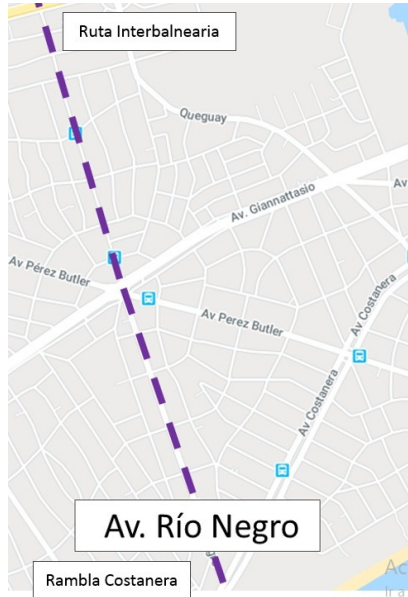

La Av. Río Negro atraviesa El Pinar de norte a sur conectando la Rambla Costanera con la Ruta Interbalnearia en una extensión de 2700 m. Esta vía actualmente presenta problemas de inundación debido a que no dispone de un correcto sistema de evacuación del agua de lluvia. Esto ha producido el deterioro de la estructura vial e hidráulica de la zona.

En respuesta a esta problemática el Gobierno de Canelones ejecutará obras que dotarán a la avenida de un correcto sistema de drenaje pluvial, mejorarán el estándar de los pavimentos y, a través de la colocación de señalización vial, brindarán mayor seguridad en la zona.

Los trabajos incluirán la apertura de 4400 m de cuneta (1.700 m se construirán con fondo de hormigón) y el tendido de asfalto en toda la avenida. Asimismo, se construirá un ingreso vehicular por padrón.

Solicitamos circular con precaución por la zona y respetar la cartelería de obra.

➔ OBRAS DE CAMINERÍA RURAL

Avanza la obra de pavimentación de la conectividad Cortada Marino



Se está ejecutando la obra de pavimentación y drenaje pluvial en camino Cortada Marino, en una extensión de 2,4 km.

La Cortada Marino (UYCA0952) es una importante conectora ubicada del Municipio de Sauce, que une las Rutas N°6 y N°7.

La obra, que inició en el mes de enero, avanzó en primera instancia en el reacondicionamiento hidráulico, en la construcción de unos 300 m de alcantarillas, y de 4800 m de limpieza y conformación de cunetas.

Se está ejecutando la pavimentación con carpeta asfáltica en toda la extensión del camino. Una vez finalizados estos trabajos se procederá a realizar la señalización vertical y horizontal correspondiente.

Continúan ejecutándose obras en caminería rural en los distintos municipios



En el Municipio de Santa Rosa, sobre camino Briñoni, Paraje La Paloma, se está trabajando en una obra hidráulica de colocación de alcantarilla, son cinco bocas con caños de 1 m de diámetro. La obra se ejecuta en sustitución del antiguo puente que estaba muy deteriorado.

Previamente, se realizó la limpieza del arroyo que cruza dicho puente en una extensión de unos 800 m.

En todo el departamento se avanza en la ejecución de las obras de mantenimiento ordinario de acuerdo al Plan de Caminería Rural, en los cuales se ejecutan tareas de limpieza, perfilado, recargo y compactación en caminos.



DOVELAS EN SOSA DÍAZ

Está en funcionamiento la obra hidráulica que se ejecutó en el camino Sosa Díaz perteneciente a los Municipios de Salinas y Atlántida. La obra consistió en la colocación de dovelas de hormigón prefabricado en dos puntos importantes del camino.

Estas obras funcionan como puentes para dar apertura y pasaje en estos cruces, permitiendo ampliar la conectividad de la zona y resguardar al camino de inundaciones recurrentes.



➔ AVANCE DE OBRAS

Consolidación barrio Porvenir La Paz



Avanza la obra de consolidación barrial en Porvenir, Municipio de La Paz. En la parte norte del barrio ya culminaron las tareas de conformación de base y pavimentación de calles. En toda la obra ya se terminó con la limpieza de cunetas, entradas vehiculares y peatonales y los trabajos de excavación de todo el barrio.

Actualmente, se está realizando:

- conformación de base para la ejecución de cordón cuneta. En toda la obra ya hay un 50% de cordón cuneta ejecutado.
- Badenes de hormigón armado en todas las esquinas.
- Últimas bocas de tormenta.

En el mes de junio, finalizó la obra de saneamiento y se colocó el colector, se realizaron todos los registros en calles y cámaras en vereda y todas la conexiones domiciliarias correspondientes.

Consolidación barrial de Canelones

La obra de consolidación de la periferia urbana de Canelones avanza a buen ritmo. Desde el mes de diciembre que inició la obra, se ha estado trabajando en los barrios Parada Rodó y Borbonet y Moreno, realizando tareas de excavación, recargo, cruce de tuberías, cruce de pluviales, cordón cuneta y carpeta asfáltica.

Hasta el momento la obra presenta un porcentaje aproximado de avance de un 30%.



➔ AVANCE DE OBRAS

Continúa obra en Marindia Norte

La obra de infraestructura vial e hidráulica en ejecución en Marindia norte registra un importante avance. Los 3,1 km de asfalto previstos en el proyecto fueron ejecutados en su totalidad.

El 90% del componente de drenaje pluvial ya fue realizado a través de la construcción de alcantarillas y cunetas revestidas en hormigón.

Próximamente, se realizará la demarcación horizontal y la señalización vertical de las calles.



Avanzan trabajos en Parque del Plata norte

La obra en Parque del Plata norte abarca la construcción de una estructura de control de pluviales, reconstrucción de cunetas de la zona de obra y entradas particulares, cruces de alcantarillas y acondicionamiento vial.

Actualmente, se está trabajando en la estructura de control de pluviales (jardín de lluvia) realizando la excavación necesaria para su construcción. La excavación presenta un 85% de avance. En breve se realizará el estabilizado y colocación de césped en los taludes.

El sistema construido hasta el momento ya ha demostrado una mejora en el desempeño hidráulico de la zona, lo que pudo constatarse durante las lluvias intensas que se produjeron en el mes de junio.



➔ SE SUMAN MÁS KILÓMETROS DE ASFALTO EN SOLYMAR NORTE

Al norte de la Av. Giannattasio en Solymar, continúa la pavimentación de las calles y avenidas principales de la zona. En esta etapa se están asfaltando las calles: Venezuela, Artigas, Williams y Rivera.

Estas obras se enmarcan en el proyecto en ejecución en Ciudad de la Costa que abarca saneamiento, drenaje pluvial, vialidad y alumbrado. Desde el inicio del proyecto se han asfaltado más de 190 km de calles y construido 390 km de cunetas para la correcta conducción de pluviales.



OBRA HIDRÁULICA EN BARROS BLANCOS

En Barros Blancos se colocó una alcantarilla con caños de 1 m de diámetro en calle Los Paraísos. Esta alcantarilla se agrega a la ya existente para favorecer la rápida evacuación de las aguas en esa zona.



RAMBLA DE COSTA AZUL

Culminaron los trabajos en la rambla de Costa Azul, en un tramo en el que el hormigón se encontraba muy deteriorado. La obra incluyó la reposición de caños para mejorar el desempeño hidráulico de este punto.

